

# ProjectLibre


[プロジェクトマネージメント]

- ・ [ProjectLibre- プロジェクト管理ツール](#)
- ・ [https://ja.osdn.net/projects/sfnet\\_projectlibre/](https://ja.osdn.net/projects/sfnet_projectlibre/)

## 使い方


### カレンダー (稼働日) の登録

- ・ [メニュー - ツール - ワークタイムの変更](#)

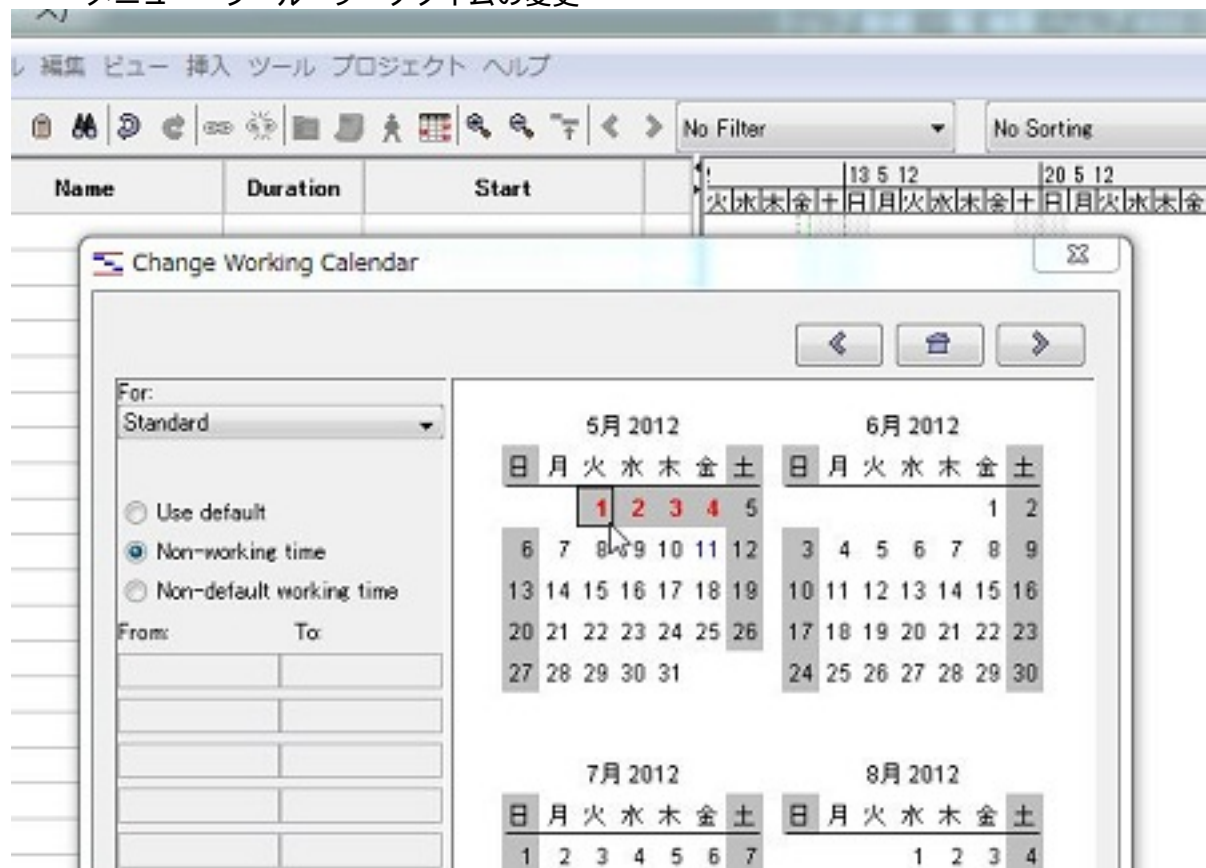

### リソース (作業員) の登録

- ・ [メニュー - ビュー - リソース](#)

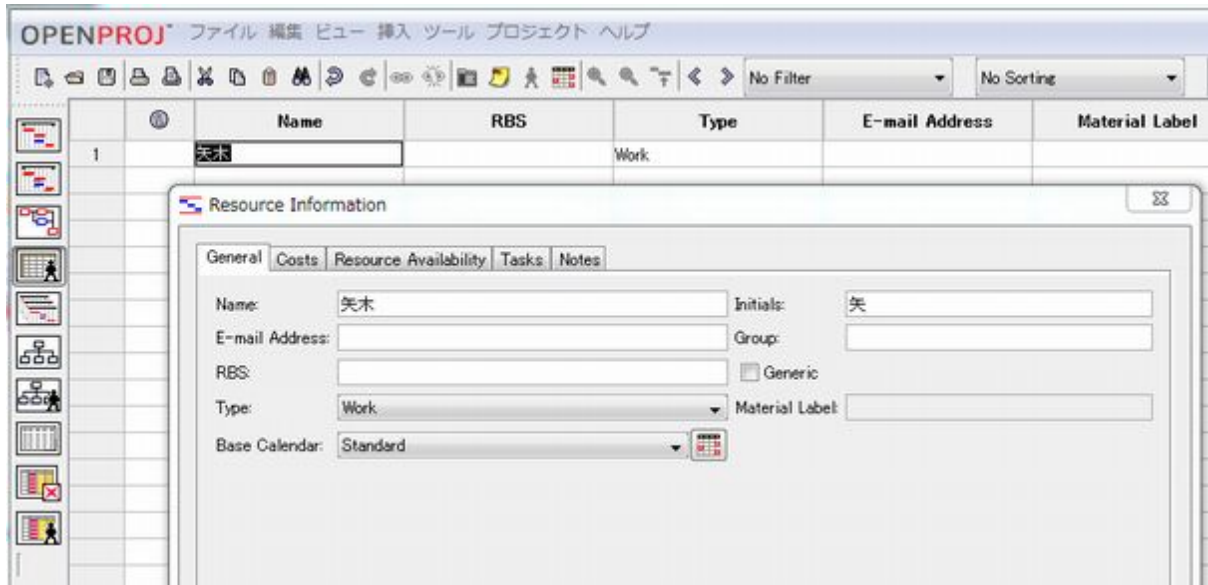

## タスク

### 期間の定義

設定単位	
m	分
h	時間
d	日 (8 時間)
w	週 (40 時間)
mon	月 (20 日)

0 を入力するとマイルストーンとなる

### 期間設定の変更

- ・ ツール - ワークタイムの変更 - Options

### タスクの順序

#### タスク順序

種類	コード	意味
終了 - 開始	FS	先行タスクが終了したら後続タスクを開始
開始 - 開始	SS	先行タスクが開始したら後続タスクも開始
終了 - 終了	FF	先行タスクが終了したら後続タスクも終了

終了 - 開始	FS	先行タスクが終了したら後続タスクが終了
---------	----	---------------------

### リンクを設定

- ・タスクを複数選択し編集 - リンク
- ・リンクが作成される

タブ	意味
Predecessors	先行タスク
Successors	後続タスク

### ラグとリード

ラグ

リード


ラグとリードの設定

- ・Lag に値 (リードの場合負数)

### タスクの制約


- ・タスクの依存関係
- ・<http://www.pmclient.com/glossary>

制約	内容
As Soon As Possible	出来るだけ早い開始日
As Late As Possible	出来るだけ遅い開始日
Must Start On	指定日に開始
Must Finish On	指定日に終了
Start No Earlier Than	指定日より早く開始しない
Start No Later Than	指定日より遅く開始しない
Finish No Earlier Than	指定日より早く終了しない
Finish No Later Than	指定日より遅く終了しない

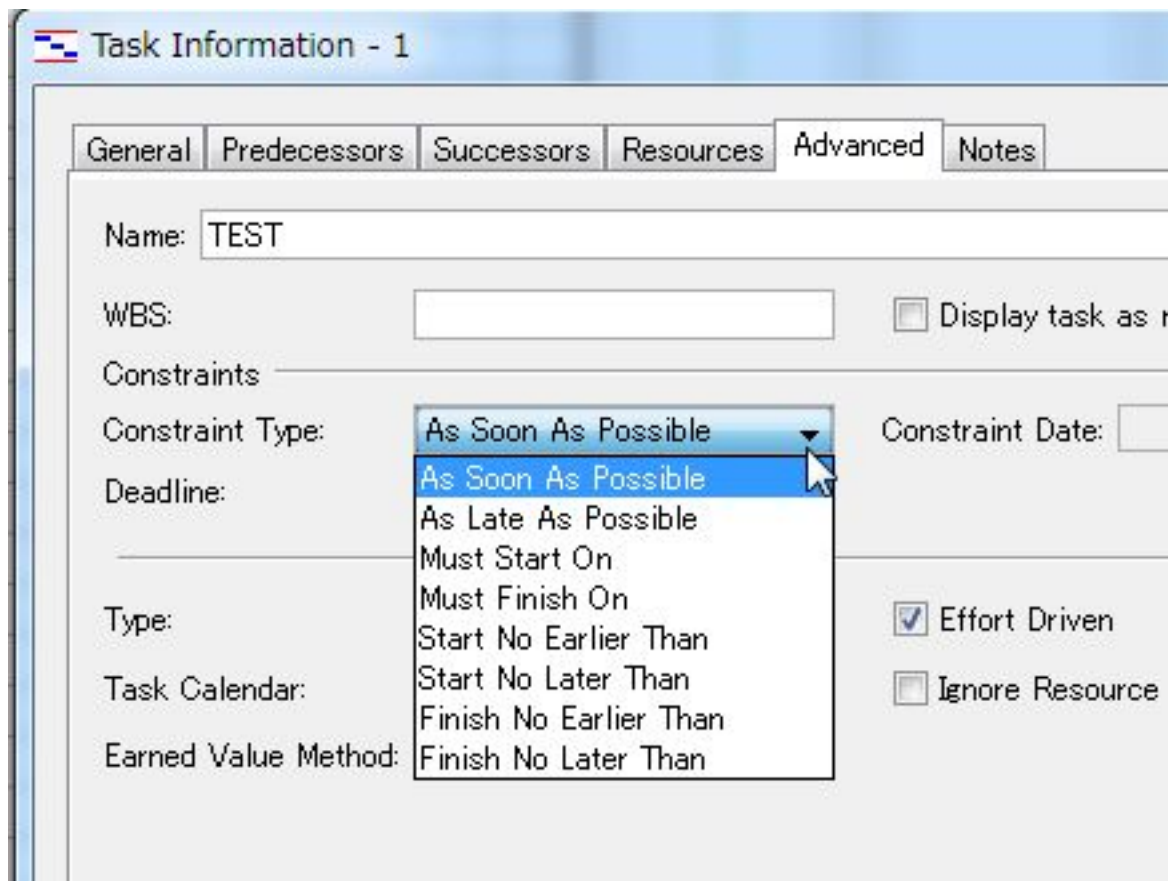

### タスクの依存関係 (リンク) を作成

- ・ネットワークビューにして、ドラッグする
- ・タスク間の制約は、コネクタをダブルクリックしてポップアップしたダイアログで設定できる。

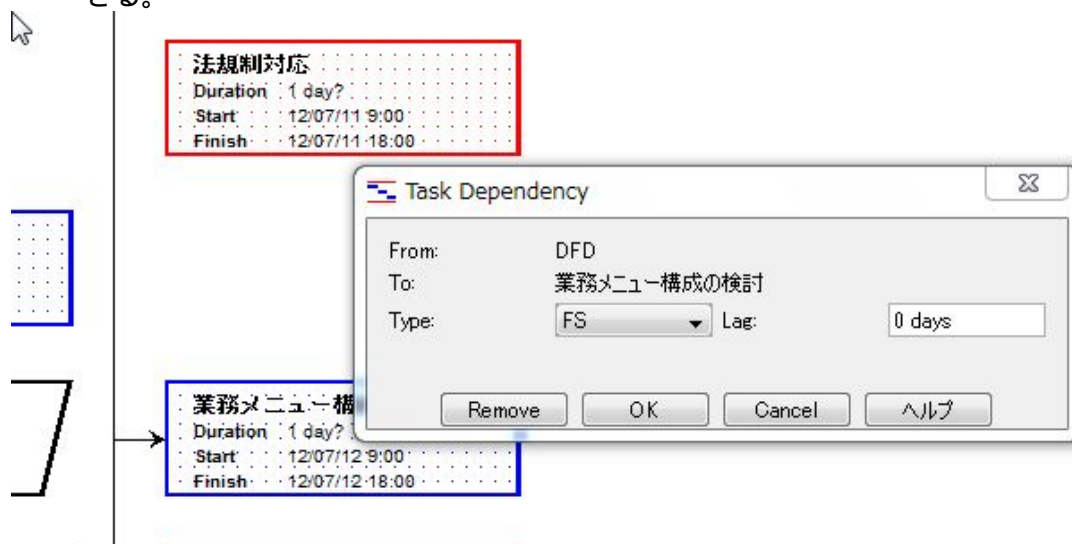

### Tips

動かない

Java1.7 インストールで .pod ファイルが開けない (Windows)

- <http://sourceforge.net/p/openproj/bugs/197/>
- OpenProj1.4.0.ini の、Maximum Version、Minimum Version を以下のように修正

Java1.6 自体のインストールは必要

```
[Java Runtime Environment]
Maximum Version=1.6
JVM Type=favor_client
Minimum Version=1.5
```

Oracle Java で動かない (Linux)

- OpenProj が Oracle Java で動かない対応 (Ubuntu)
